




BUKKESPRANGET VA

FREMDRIFT

- Hovedledning fra Helgeroa
- Stokkøya
- Store Arøya
- Vesle Arøya
- Lille Arøya
- Halveisholmen



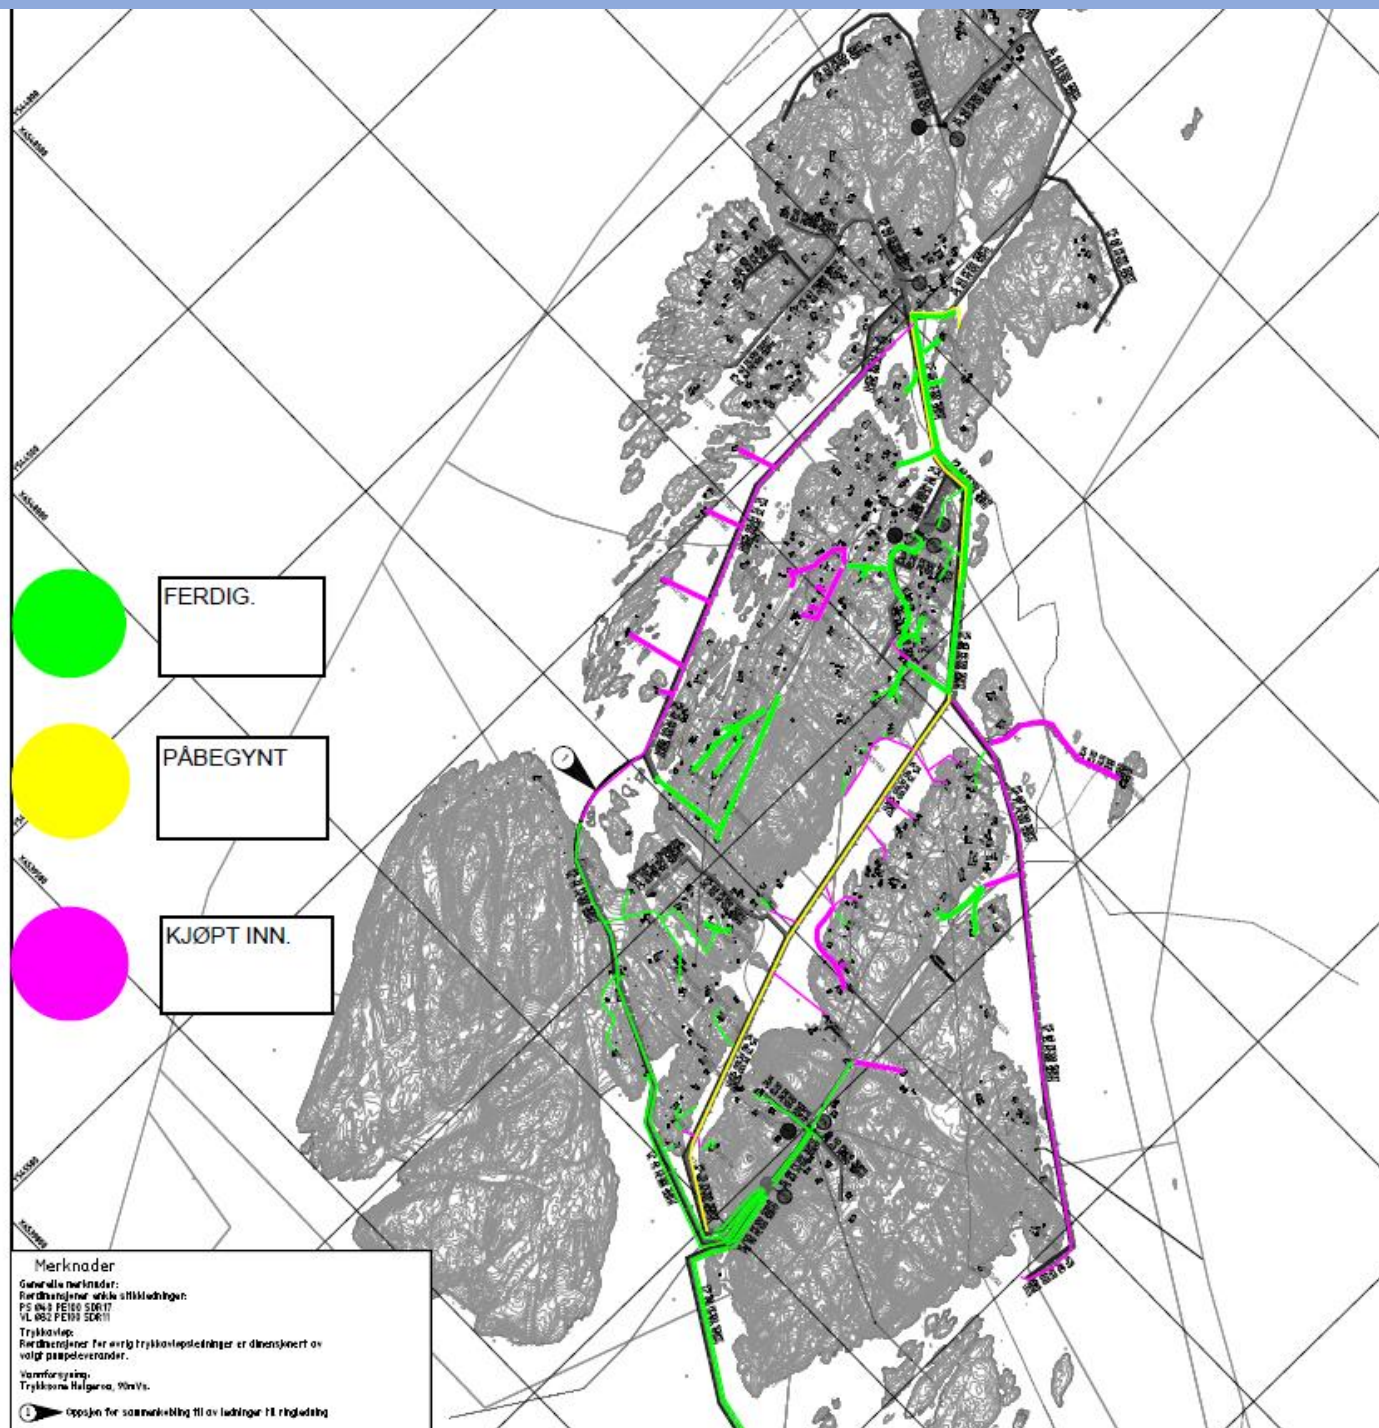

FREMDRIFT

- HOVEDLEDNING FRA HELGEROA
 - Innkobling og nedsetting av kummer i Helgeroa er ferdig
 - Hovedsjøledning til Stokkøya ferdig, 3154 meter
 - Hovedgrøft på land Stokkøya er ferdig frem til hovedkummer




FREMDRIFT

- STOKKØYA
 - 400 meter hoved- og fellesledninger på land og i sjø
 - 600 meter private stikkledninger på land og i sjø
 - 4 hytter har fått montert pumpestasjon




FREMDRIFT

- STORE ARØYA
 - 2100 meter hoved- og fellesledninger på land og i sjø
 - 11 borehull i fjell, ca 800 meter
 - 2500meter private stikkledninger på land og i sjø
 - 7 hytter har fått montert pumpestasjon

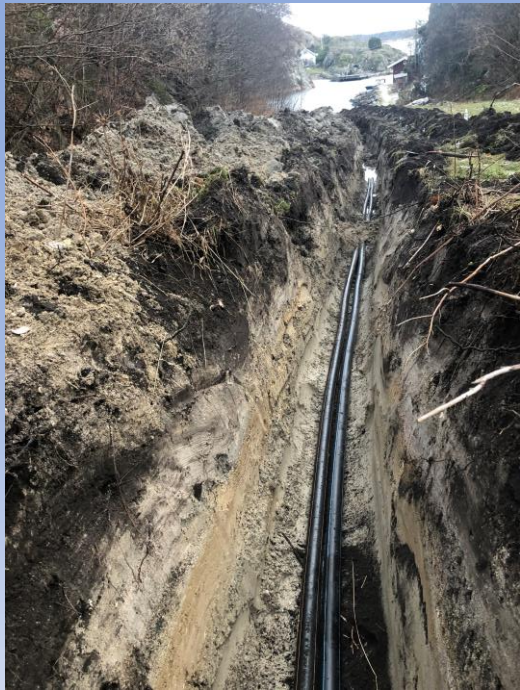

FREMDRIFT

- VESLE ARØYA
 - 550 meter hoved- og felles grøfter i sjø
 - 100 meter private stikkledninger på land og i sjø

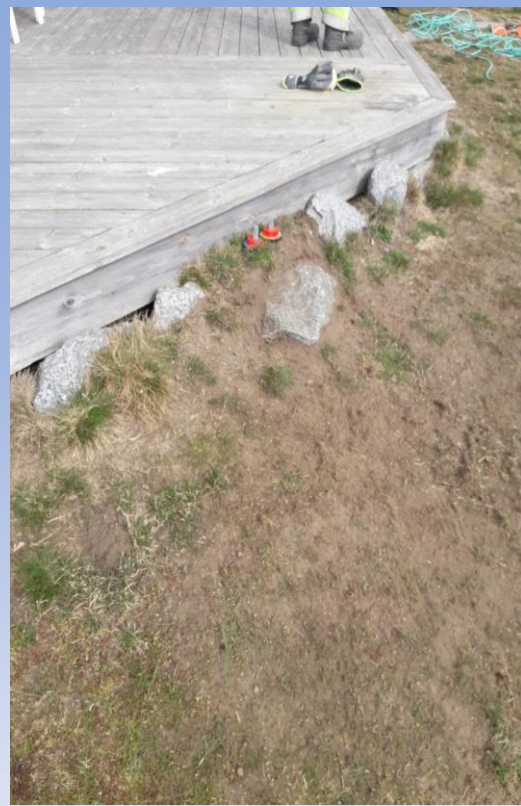

FREMDRIFT

- LILLE ARØYA
 - Utført befaringer
 - Oppstart planlagt august/september 2019

FREMDRIFT

- HALVEISHOLMEN
 - Uført befaringer
 - Oppstart planlagt august/september 2019

FREMDRIFT

- Oppstart arbeider med hovedkummer og felles pumpestasjoner medio juni
- Slutføre fellesgrøfter og stikkledninger Store Arøya medio august
- Oppstart Lille Arøya og Halveisholmen medio august/september
- Hoved og felles sjøledninger slutføres medio oktober

FREMDRIFT

- Private stikkledninger og pumpestasjoner monteres fortløpende
 - Styres etter fremdrift på fellesledninger
 - Etter avtale med hytteeiere



BUKKESPRANGET VA
